



Planimetria 1a fase 1:150

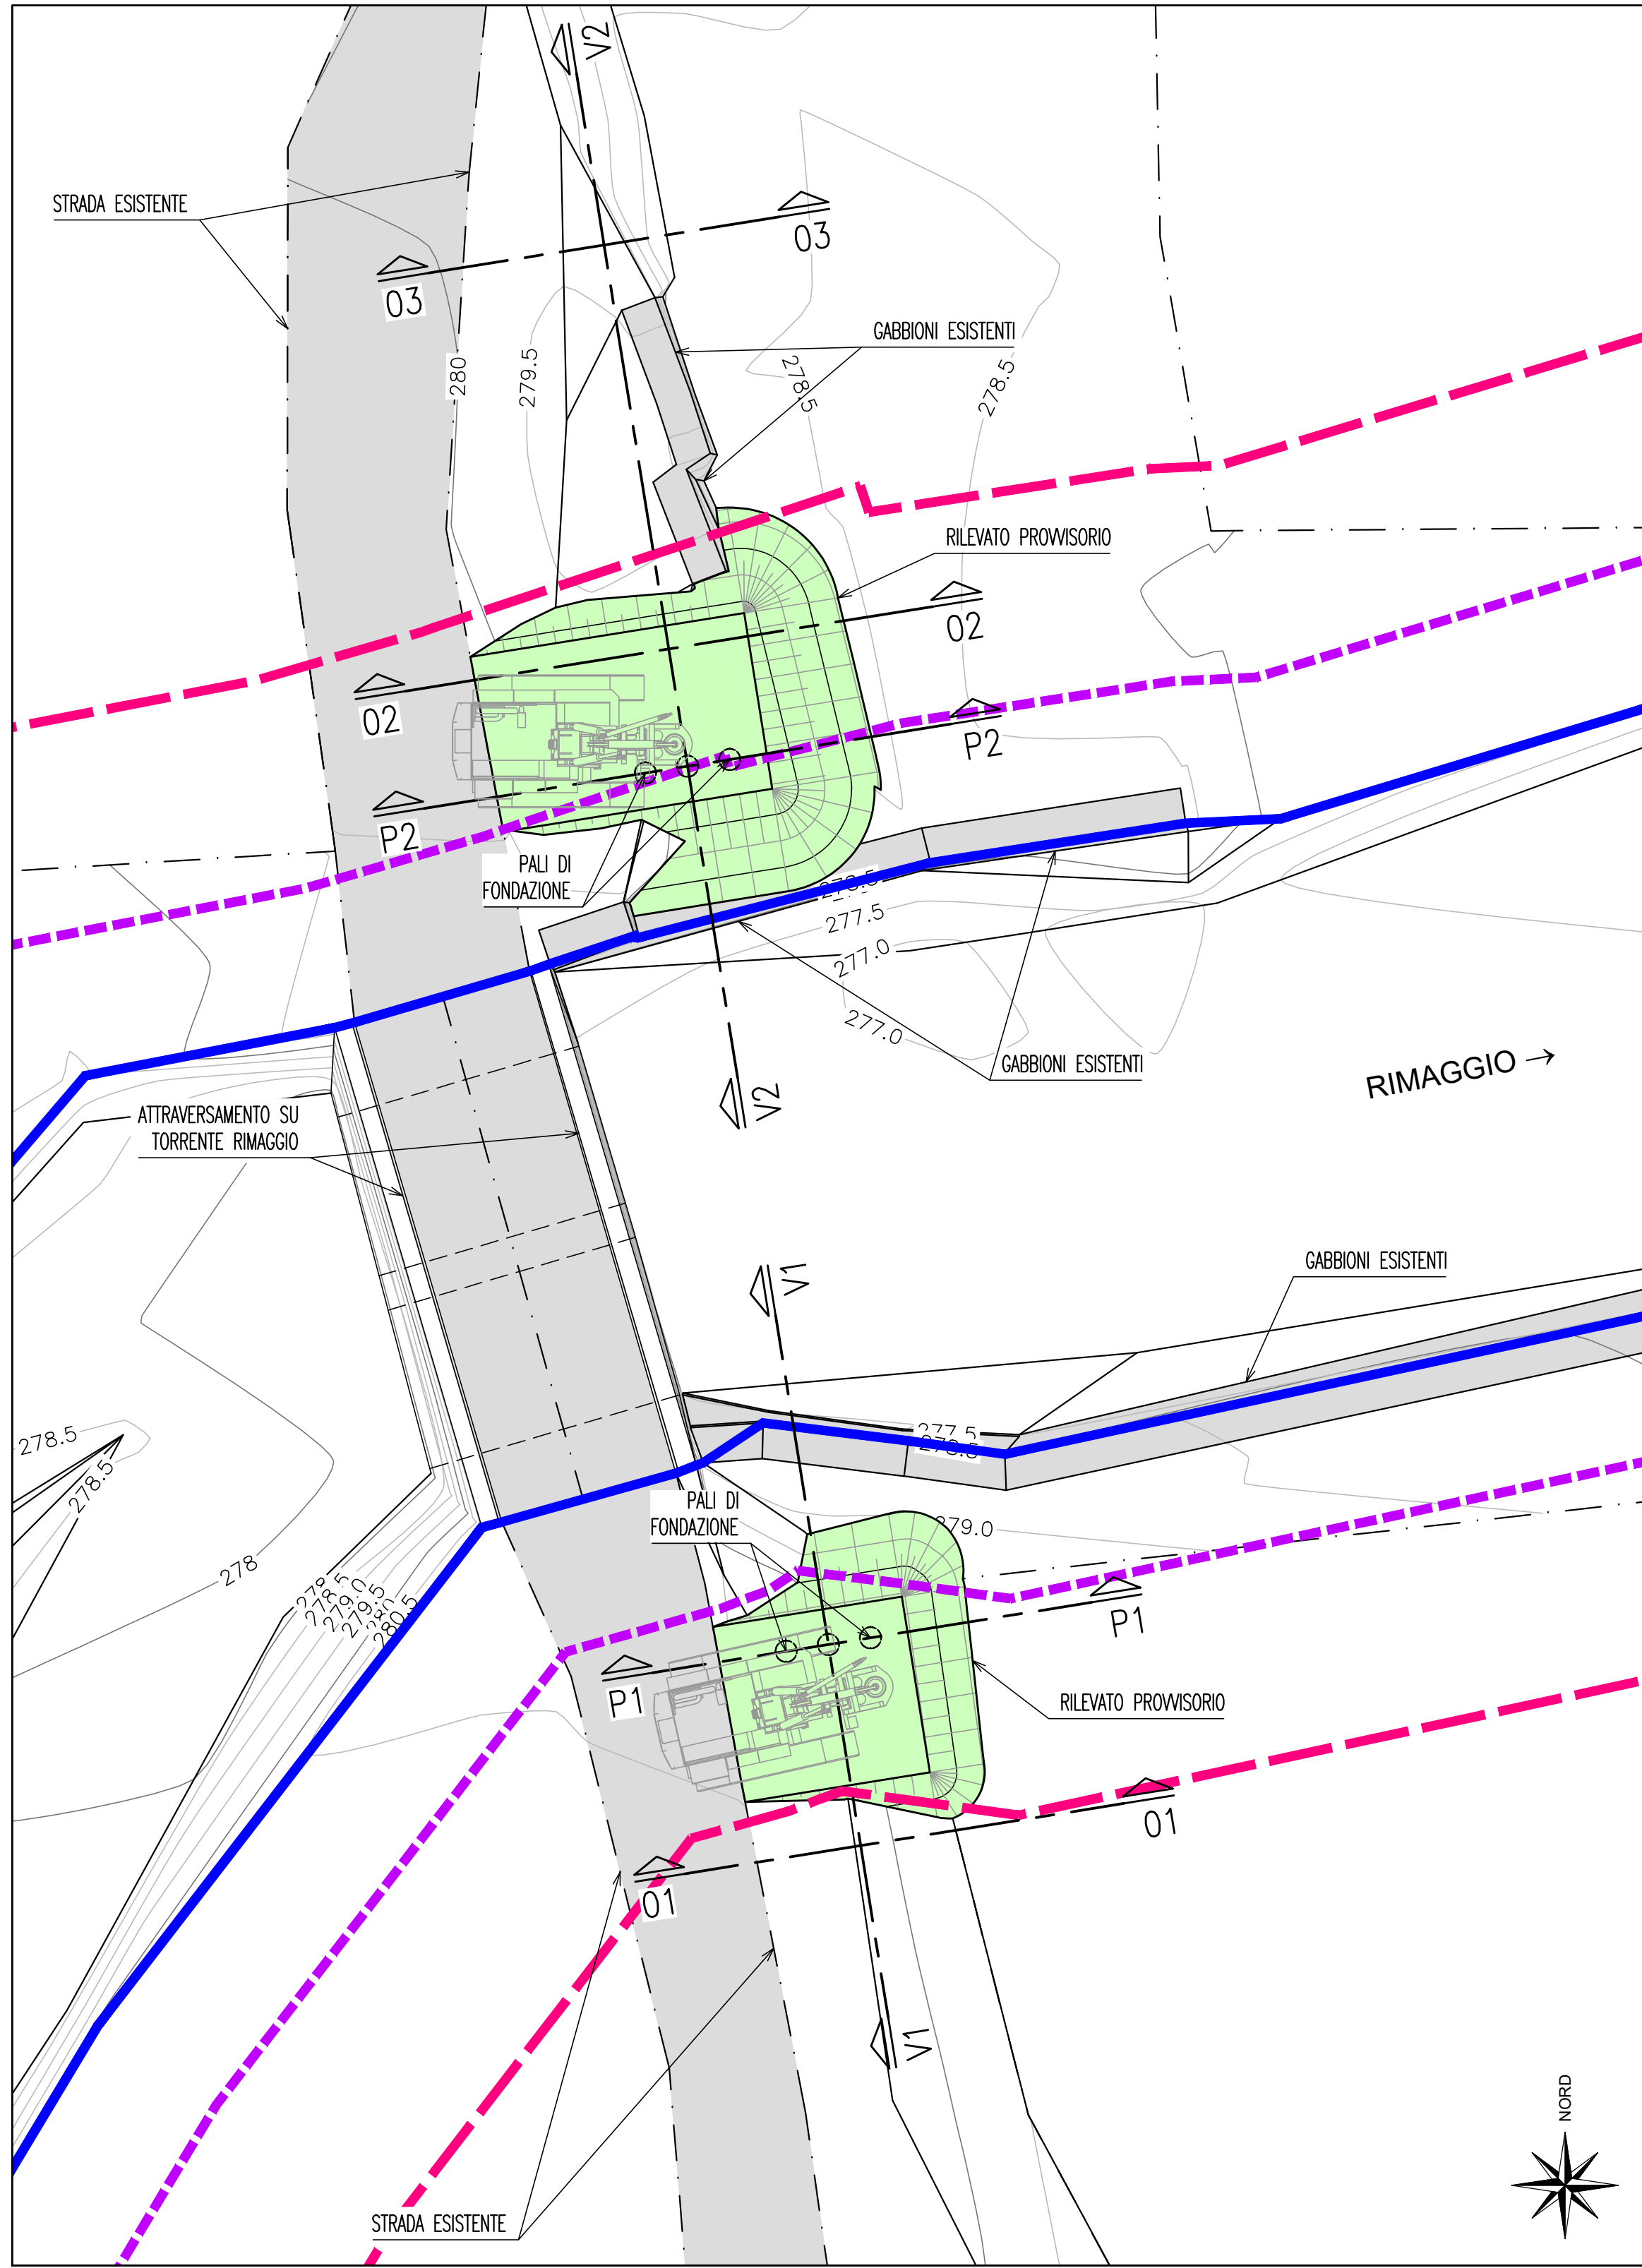


- FASI ESECUTIVE:
- REALIZZAZIONE RILEVATI PROVVISORI PER ESECUZIONE PALI DI FONDAZIONE.
  - PERFORAZIONE A VUOTO NEL PRIMO TRATTO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA PUNTA PALO.
  - REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE.

Planimetria 2a fase 1:150

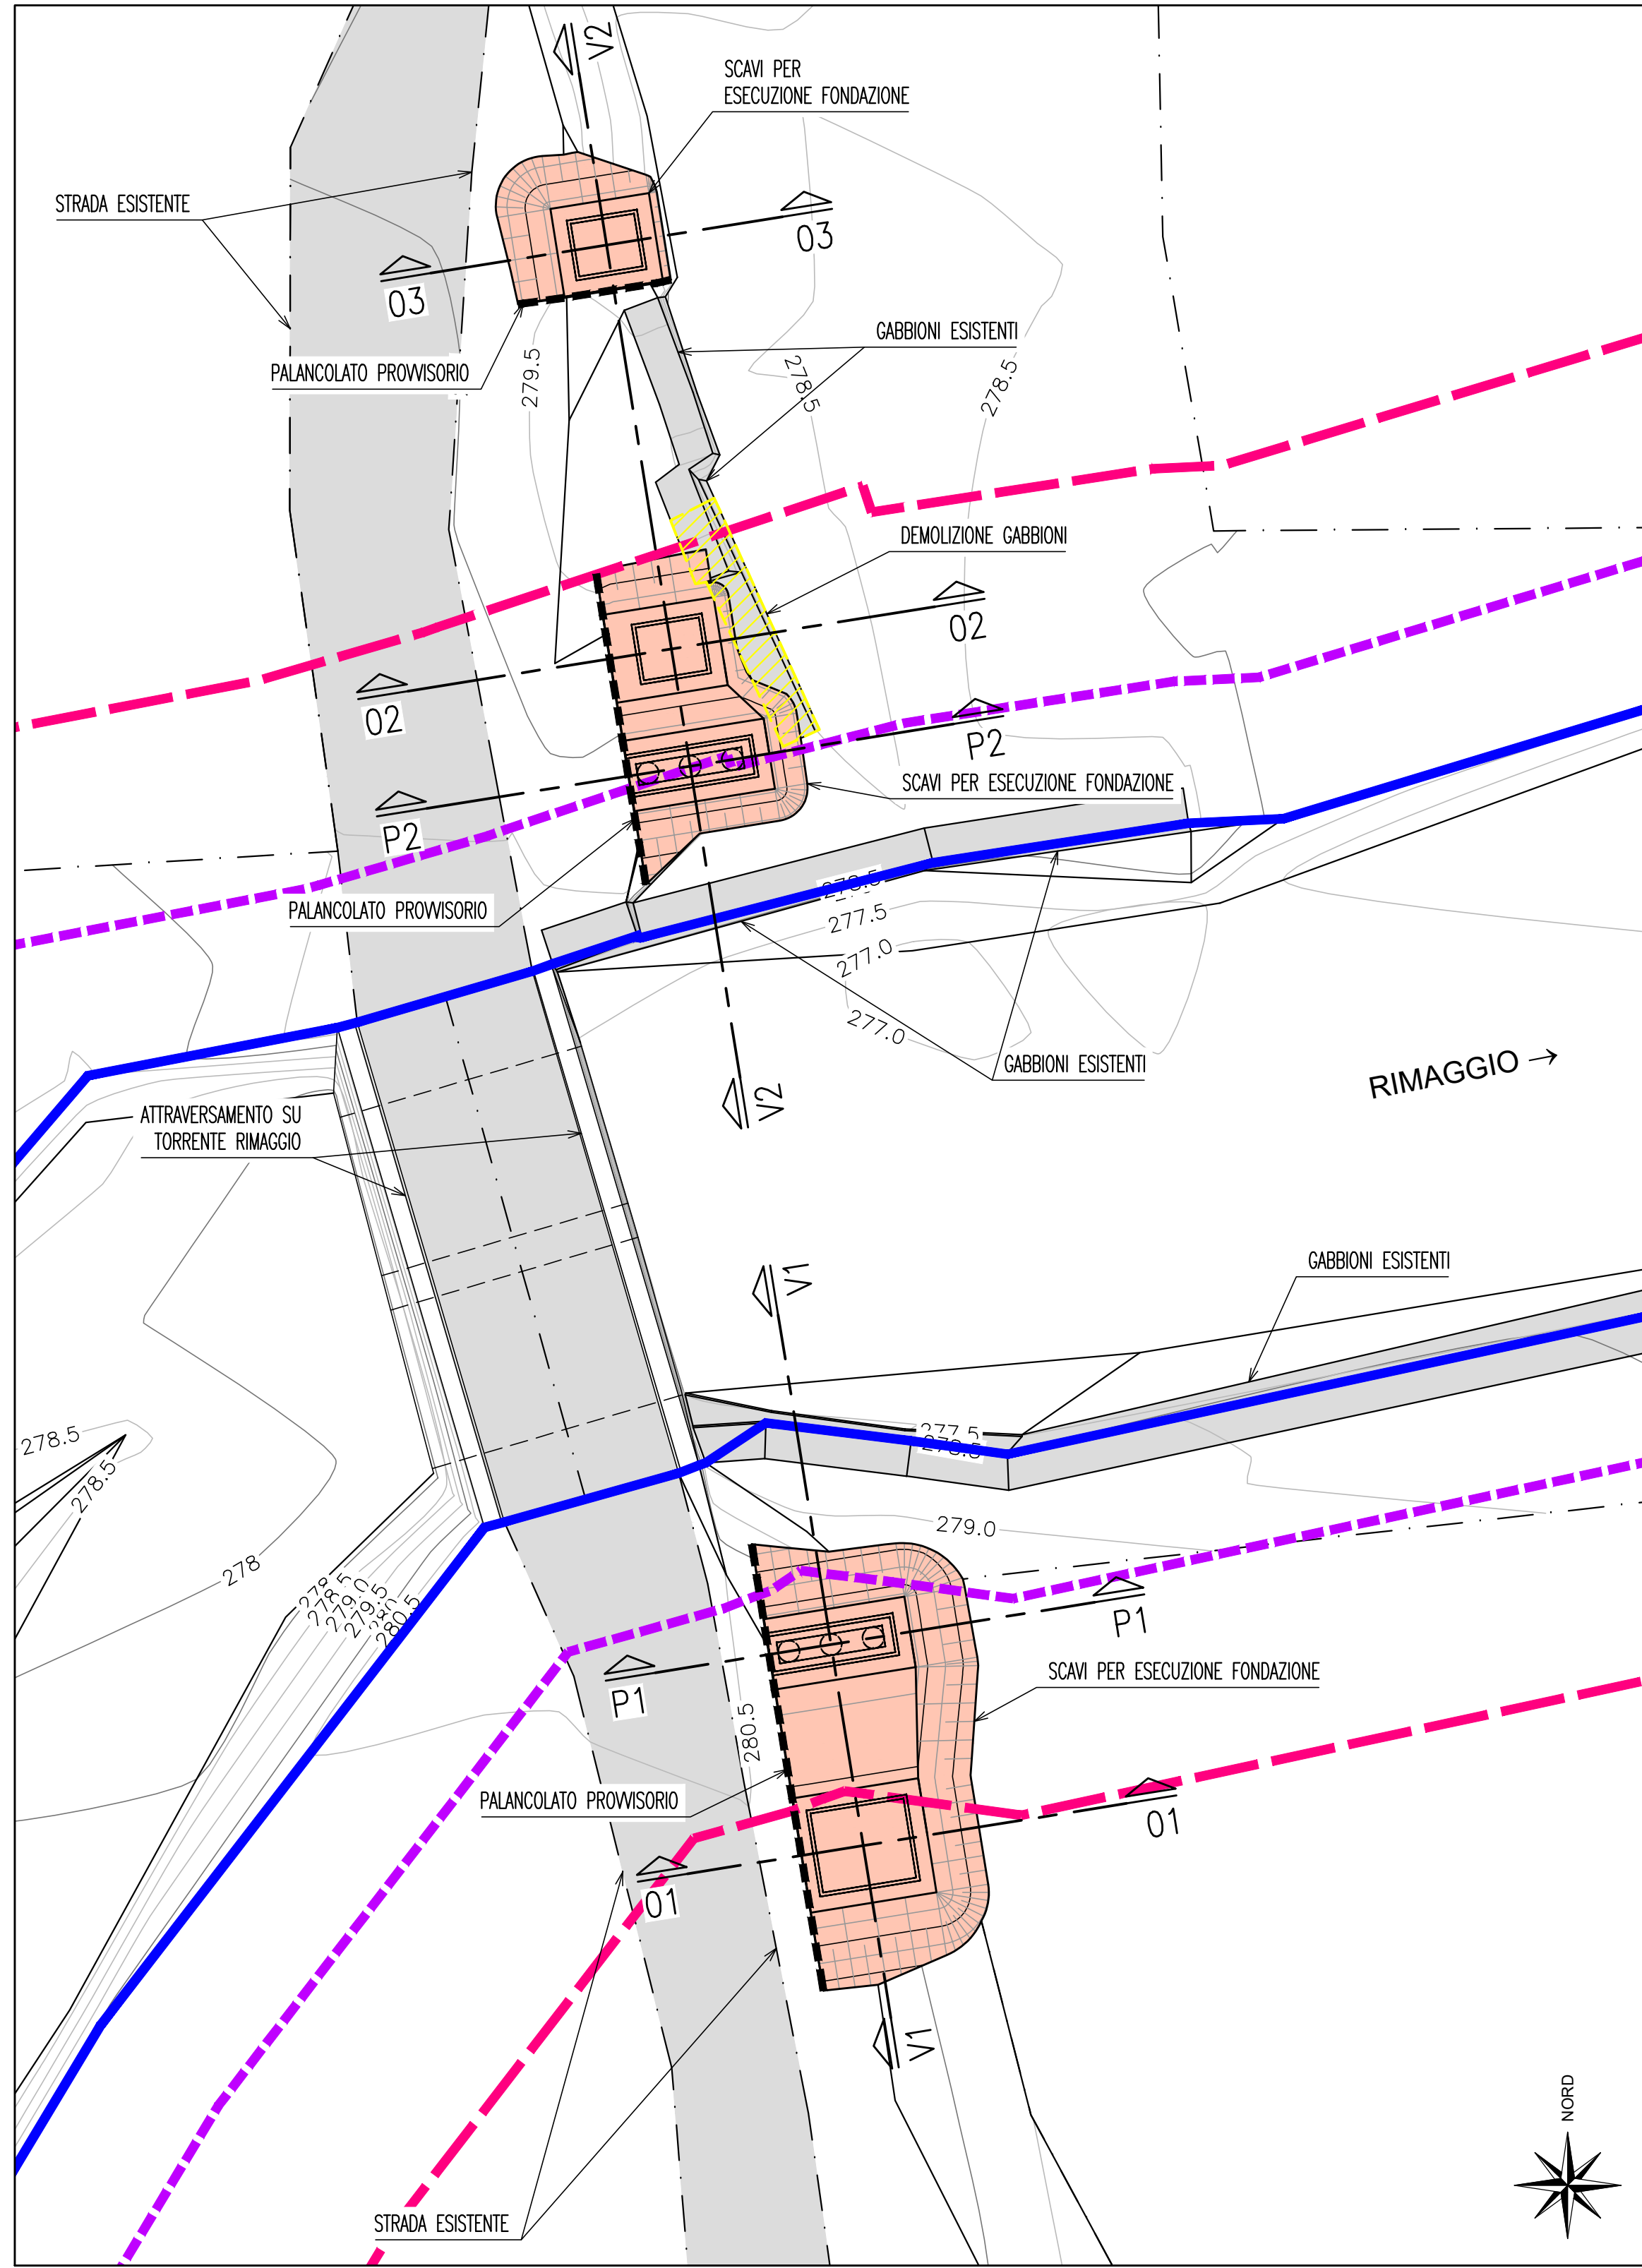


- FASI ESECUTIVE:
- RIMOZIONE RILEVATI PROVVISORI.
  - REALIZZAZIONE PALANCOLATI PROVVISORI PER ESECUZIONE SCAVI.
  - DEMOLIZIONI GABIONI INTERFERENTI CON GLI SCAVI.
  - REALIZZAZIONE SCAVI PER ESECUZIONE FONDAZIONI VAPORDOTTO.
  - ESECUZIONE FONDAZIONI VAPORDOTTO.

Planimetria 3a fase 1:150

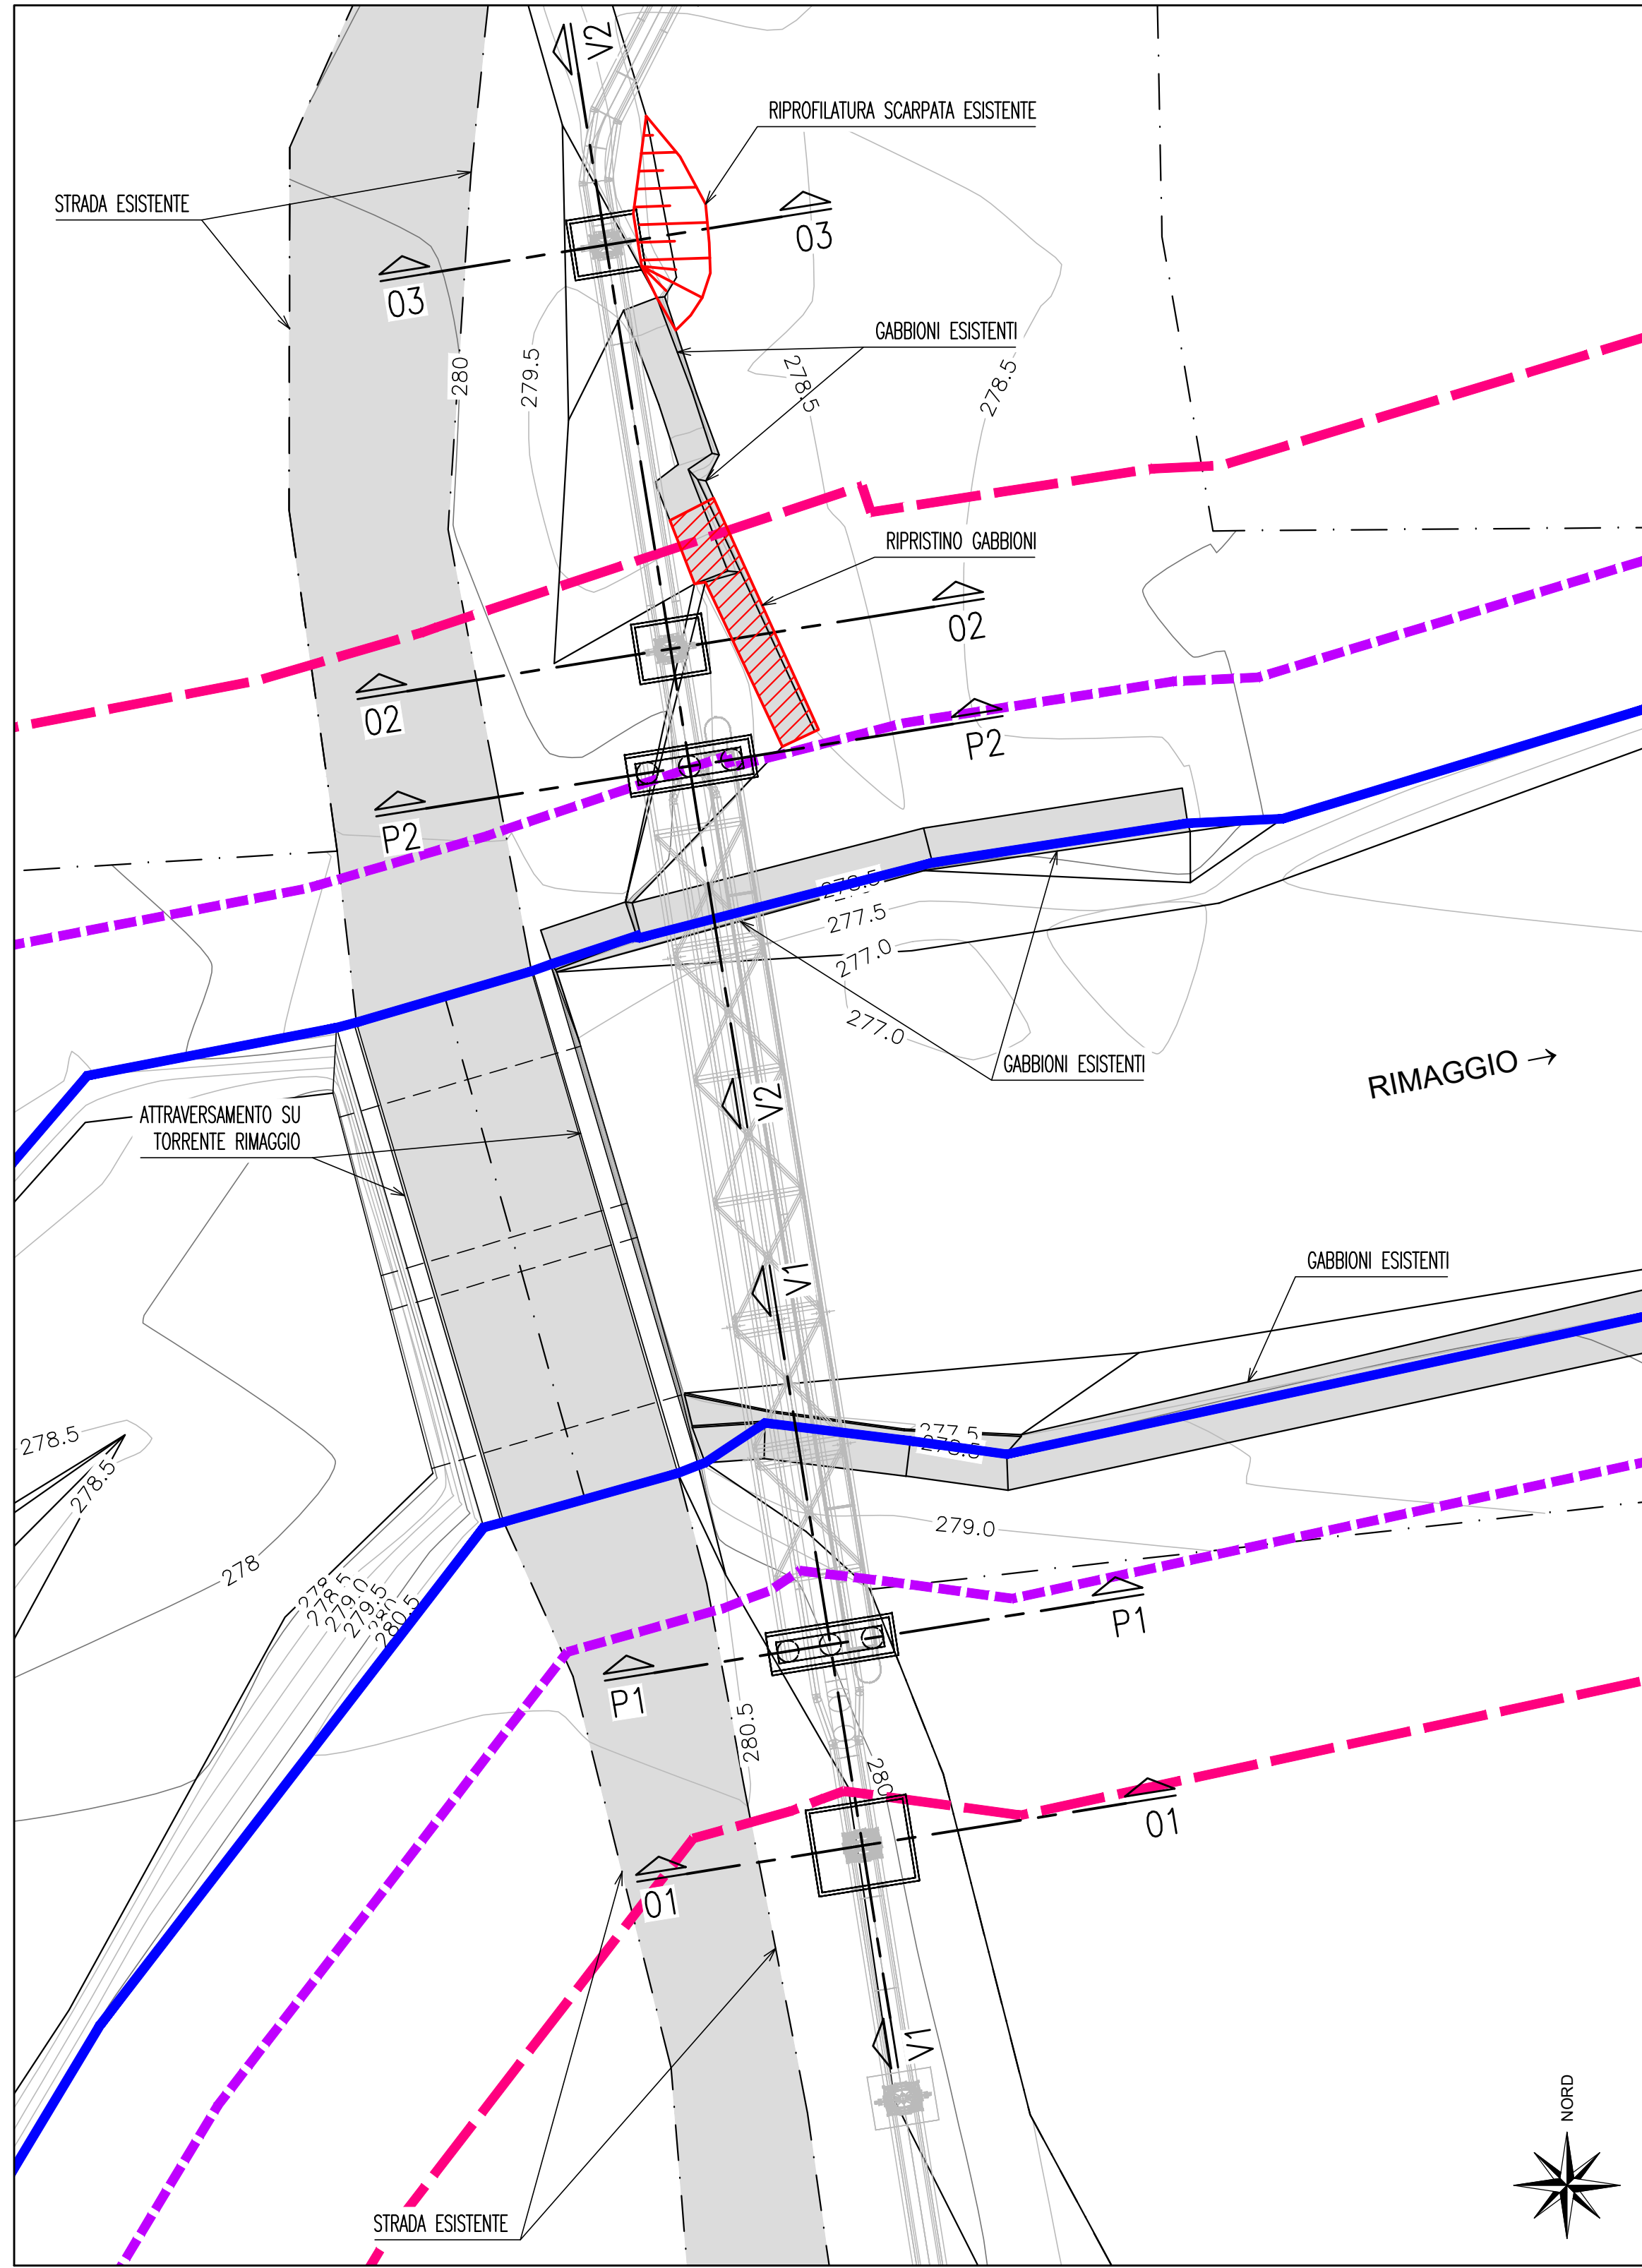

- FASI ESECUTIVE:
- RITOMBAMENTO SCAVI
  - RIPRISTINO DEI GABIONI ESISTENTI DEMOLITI NELLE FASI PRECEDENTI
  - RIMOZIONE PALANCOLE PROVVISORIE.
  - COMPLETAMENTO VAPORDOTTO.

Carta Tecnica Regionale 1:10000

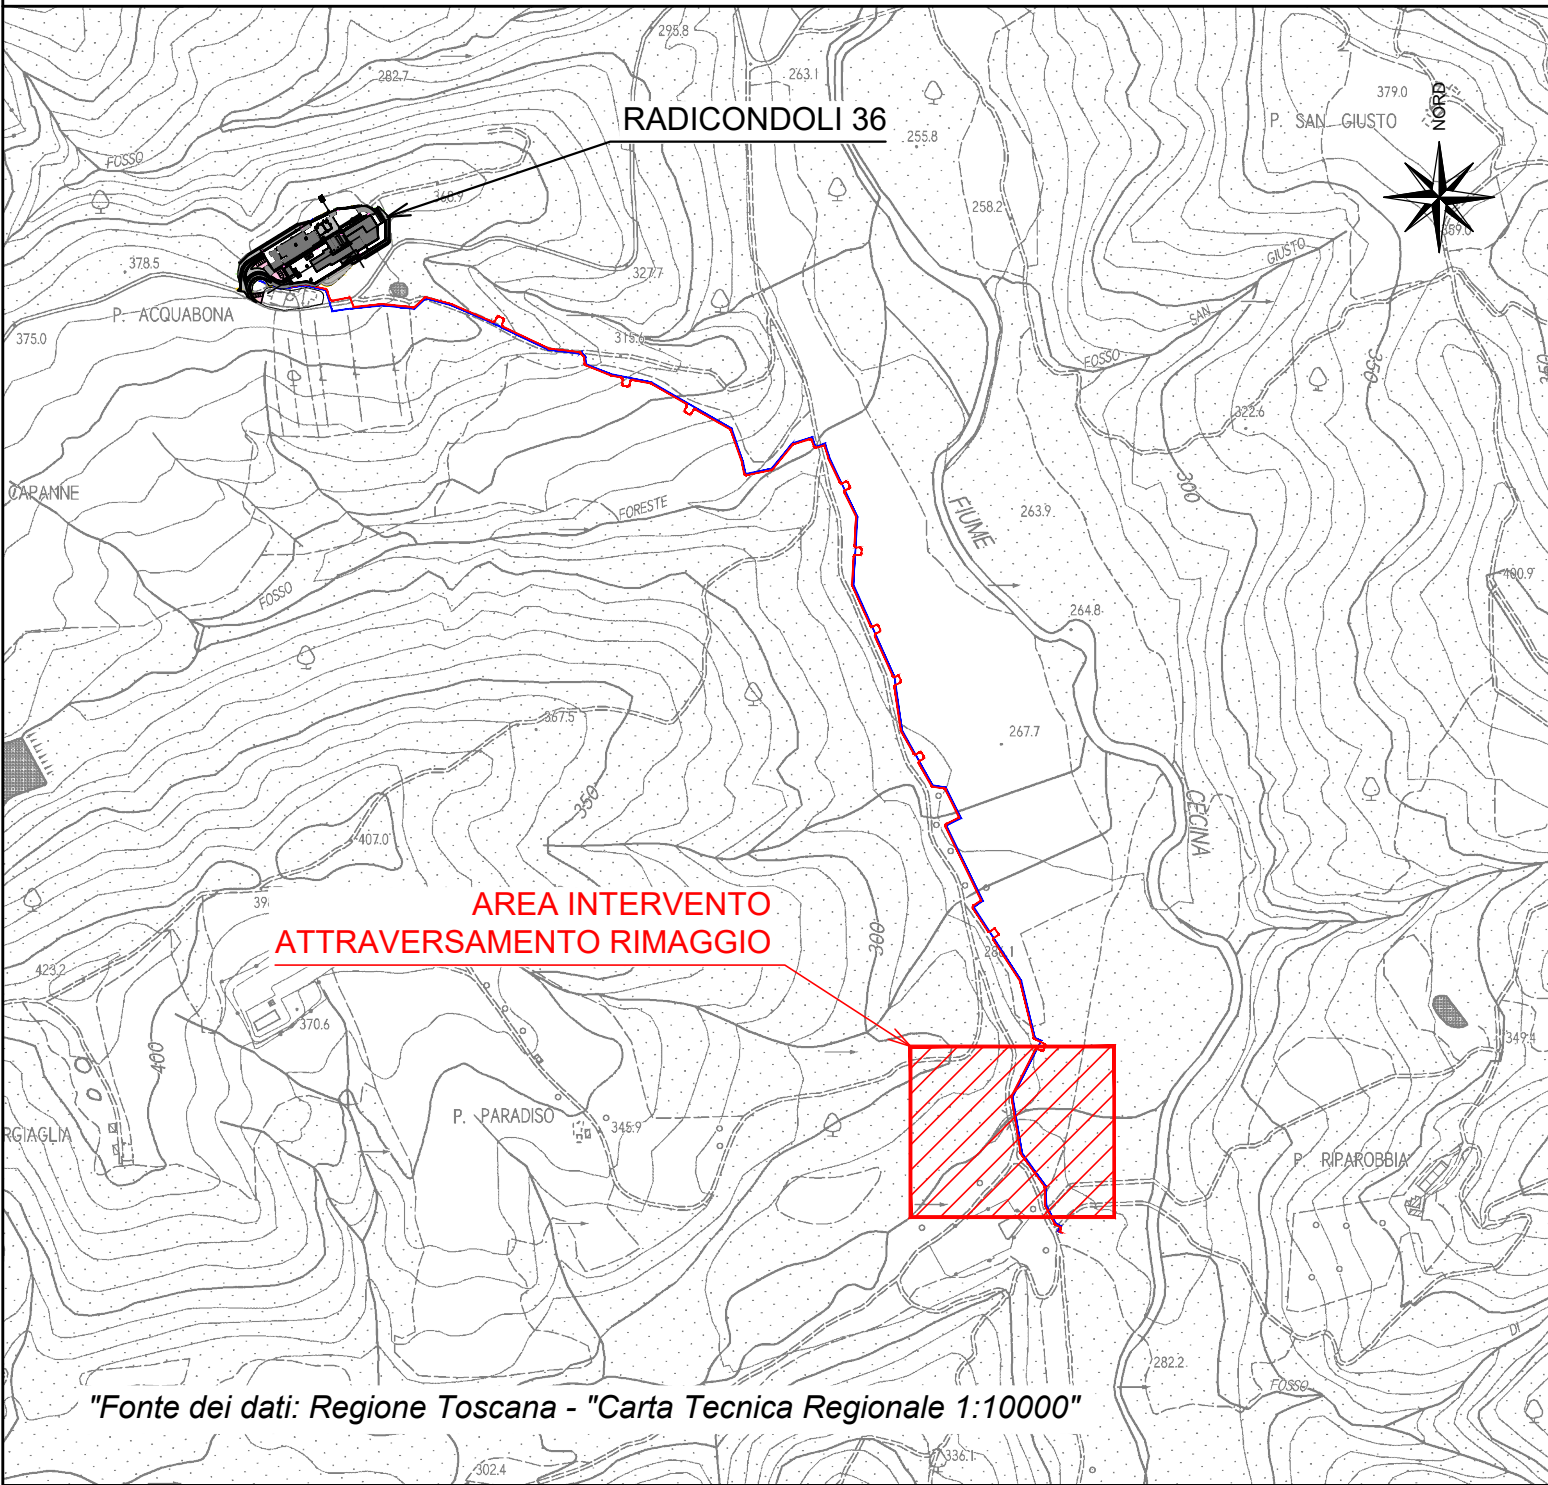

DISEGNI DI RIFERIMENTO

GRE.EEC.D.28.IT.G.13407.00.073 R36204\_GCM4 - Vapordotto: Planimetria e Sezioni Attraversamenti del Reticolo Idraulico  
GRE.EEC.D.28.IT.G.13407.00.100 R36300\_GCM5 - Rilevi Topografici  
GRE.EEC.D.28.IT.G.13407.00.101 R36301\_GCM6 - Planimetria Stato di Fatto  
GRE.EEC.D.28.IT.G.13407.00.102 R36302\_GCM7 - Sezioni Stato di Fatto  
GRE.EEC.D.28.IT.G.13407.00.103 R36303\_GCM8 - Planimetria Stato di Progetto  
GRE.EEC.D.28.IT.G.13407.00.104 R36304\_GCM9 - Sezioni Stato di Progetto  
GRE.EEC.D.28.IT.G.13407.00.105 R36305\_GCM10 - Fasi esecutive delle fondazioni

NOTE

GLI INTERVENTI SONO BASATI SULLO STATO DI FATTO DEFINITO DAL RILEVATO TOPOGRAFICO ESEGUITO.

LEGENDA

- CIGLIO CORSI D'ACQUA RILEVATO
  - - - FASCIA DI RISPETTO 4 m DA CIGLIO CORSO D'ACQUA
  - - - FASCIA DI RISPETTO 10 m DA CIGLIO CORSO D'ACQUA
- Fascia di pertinenza fluviale ai sensi del R.D. 523/1904 comma f)

- RILEVATI
- SCAVI
- DEMOLIZIONI
- PALANCOLATI
- RIPRISTINO GABIONI
- RITOMBAMENTO SCAVI
